

DIARIO DEL PROGETTO — SKILLSHARE

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

INFORMATICA PER IL MANAGEMENT, A.A. 2025/2026

PROJECT BOARD: [PROJECT PROJECT BOARD](#)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO: [TOMMASO PRANDINI](#), [FEDERICO MALSERVIGI](#), [ALESSIA SIRIANNI](#), [GABRIELE BUFALO](#).

Definition of Done adottata dal gruppo (valida per ogni sprint):

1. Il codice compila con mvn clean install in app/.
2. La logica di dominio introdotta ha almeno un test JUnit 5 e mvn test passa.
3. Validazione presente sia lato client sia lato server.
4. Nessun dato sensibile (hash password, salt) esce dal server nei DTO.
5. La UI dà feedback esplicito per successo ed errore.
6. Pull Request collegata all'issue e approvata da un altro membro prima del merge.
7. Card in Done sulla Project Board.

SPRINT 1 — DAL [19/08/2026] AL [21/08/2026]

SPRINT GOAL

Permettere a un nuovo utente di entrare in SkillShare e costruire la propria identità: registrazione, accesso, visualizzazione e personalizzazione del profilo con bio, foto e tag di competenza.

RUOLI DELLO SCRUM TEAM

Membro	Ruolo Scrum in questo sprint
Tommaso Prandini	Product Owner
Federico Malservigi	Scrum Master
Alessia Sirianni	Developer
Gabriele Bufalo	Developer


USER STORY IMPEGNATE

ID	User Story	Somma Ore	Esito
US-1	Welcome screen e navigazione	1	Completata


US-2	Registrazione utente	5	Completata
US-3	Login utente	3	Completata
US-4	Visualizzazione profilo utente	6.5	Completata
US-5	Modifica e personalizzazione profilo	4.5	Completata

STATO DELLA BOARD SU GITHUB (TRASPARENZA)

BOARD A INIZIO SPRINT — [19/08/2026]

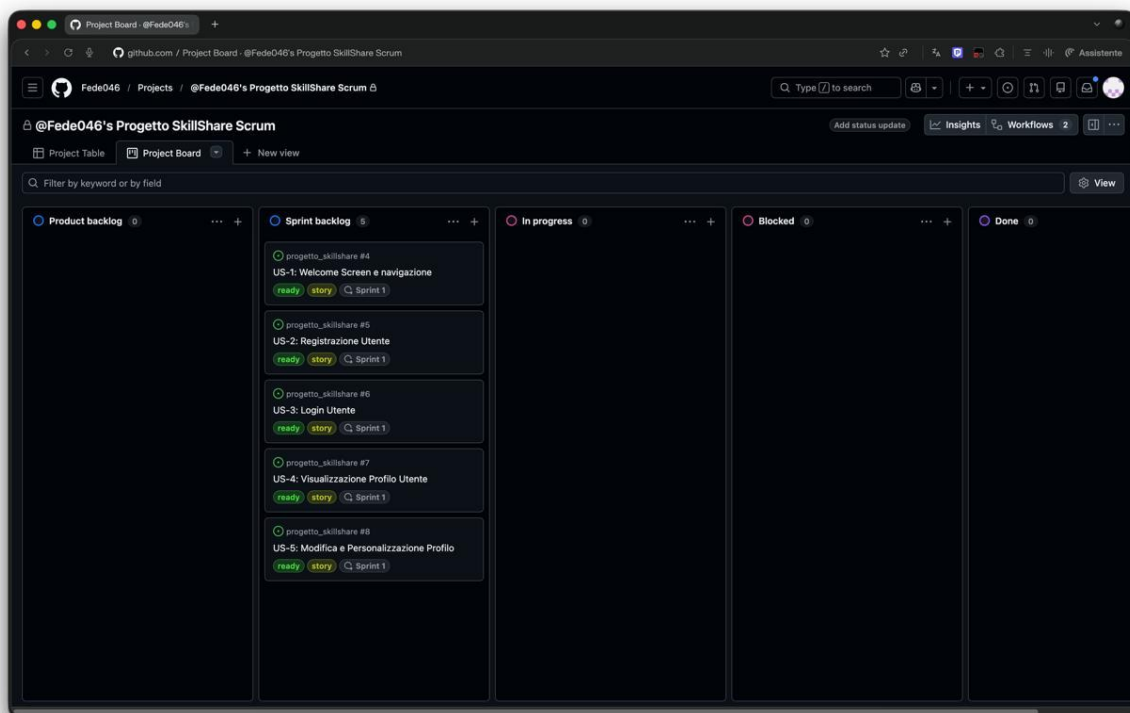

BOARD A FINE SPRINT — [21/08/2026]:

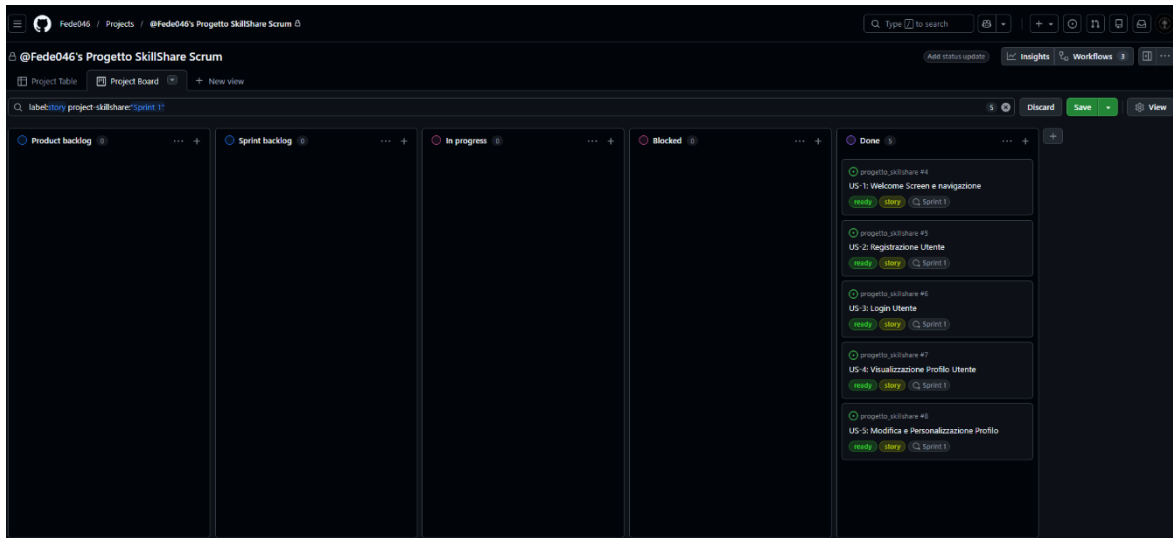

COSA È STATO FATTO DURANTE LO SPRINT

Lo Sprint 1 ha prodotto il primo incremento funzionante dell'applicazione, incentrato sull'ingresso dell'utente e sulla gestione della sua identità. La persistenza è stata realizzata su MapDB attraverso la classe `UtenteDatabase`, che gestisce una `ConcurrentMap` di utenti con commit esplicito su disco; l'autenticazione cifra le password con SHA-256 sia in registrazione sia in fase di verifica delle credenziali, e il modello dei dati condiviso (`UtenteDTO`) è stato esteso con bio, foto e tag di competenza. Sul lato server ogni funzionalità è esposta tramite servizi RPC (`RegistrazioneService`, `AccessoService`, `ProfileService`) mappati come servlet in `web.xml`, che delegano la logica a `UtenteDatabase`. Lato client sono state realizzate la schermata di benvenuto (`WelcomeGui`) come entry point, i form di registrazione e accesso con validazione lato client, la vista del profilo (`ProfiloGui`) con i tag resi come badge, e la modalità di modifica con gestione dinamica dei tag. Le regole di persistenza e recupero dei dati sono coperte da test unitari JUnit 5 su istanze MapDB isolate.

NOTE, DECISIONI E IMPEDIMENTI

- **Note:** Durante la code review il PO ha segnalato alcuni miglioramenti grafici sulle pagine di profilo e modifica profilo. Non riguardando i criteri di accettazione di #7 e #8, sono stati tracciati come miglioramento a parte (issue #36) e realizzati nello sprint; il PO ha poi accettato la nuova interfaccia.
- **Decisioni del Product Owner:** nessuna decisione su ambiguità delle specifiche in questo sprint.
- **User Story non completate:** Nessuna: tutte le user story impegnate sono state chiuse.
- **Impedimenti riscontrati:** Nessun impedimento riscontrato.

RETROSPETTIVA

Cosa ha funzionato bene:

- Lo Scrum Master ha tenuto un allineamento giornaliero con i developer tramite chiamate di gruppo: questo ha ridotto i disallineamenti sullo sviluppo e reso rapida la risoluzione dei dubbi.
- La struttura a strati definita a inizio sprint ha permesso di lavorare su client e server in parallelo senza conflitti di integrazione rilevanti.

Cosa possiamo migliorare:

- La comunicazione è stata efficace sull'allineamento quotidiano ma informale sulle decisioni tecniche.
- Maggiore attenzione da parte dei dev di dettagli grafici

SPRINT GOAL

Abilitare il core del marketplace di SkillShare: permettere agli utenti autenticati di pubblicare nuove offerte didattiche, gestirle (modificandole o rimuovendole) e navigare la lista generale delle proposte pubblicate dagli altri utenti, accompagnato da un importante lavoro di enhancement grafico e stilistico della GUI.


RUOLI DELLO SCRUM TEAM

Membro	Ruolo Scrum in questo sprint
Tommaso Prandini	Developer
Federico Malservigi	Developer
Alessia Sirianni	Scrum Master
Gabriele Bufalo	Product Owner


USER STORY IMPEGNATE

ID	User Story	Somma Ore	Esito
US-6	Pubblicazione Annunci	7	Completata
US-7	Gestione Annuncio	5	Completata
US-8	Lista delle Proposte (Marketplace)	4	Completata

BOARD A INIZIO SPRINT — [22/08/2026]

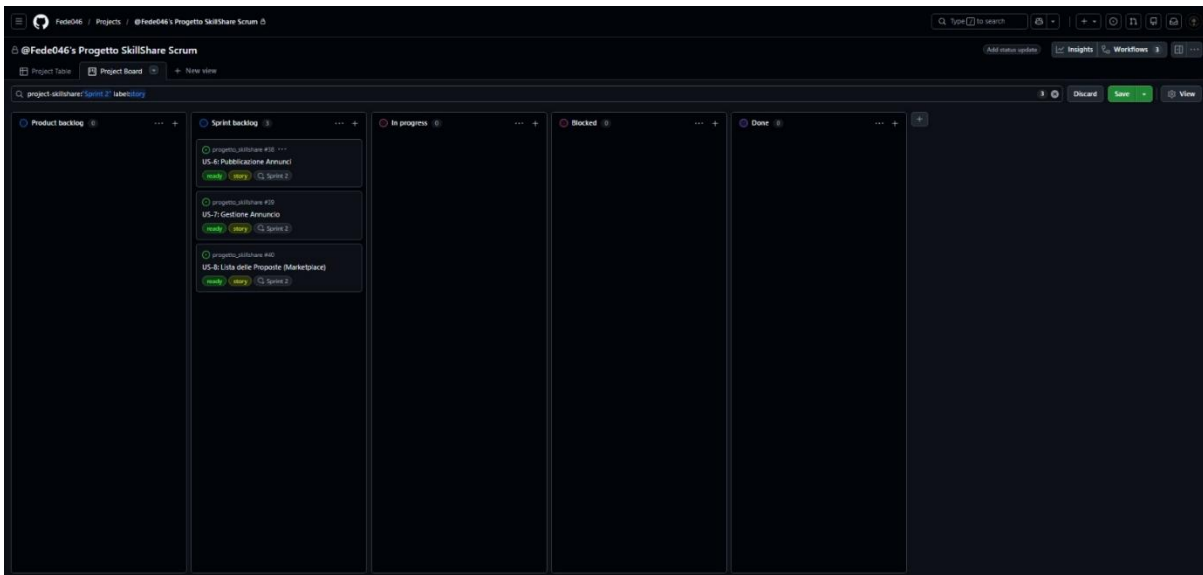

BOARD A FINE SPRINT — [24/08/2026]:

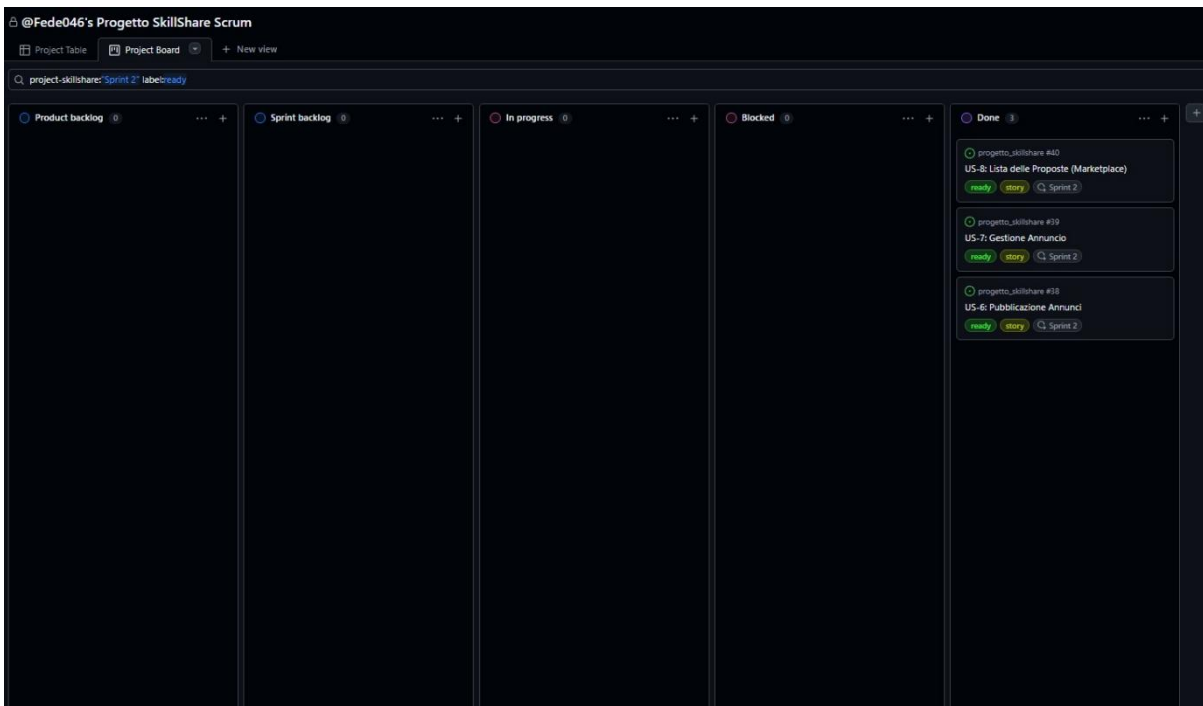

COSA È STATO FATTO DURANTE LO SPRINT

Lo Sprint 2 ha introdotto il cuore dello scambio delle competenze all'interno della piattaforma. È stato implementato il modello di persistenza e la logica di business per la gestione degli annunci tramite l'introduzione di collezioni dedicate su MapDB e i relativi DTO di scambio. Sul lato server sono stati esposti i servizi RPC per la creazione, modifica, eliminazione e il recupero di tutte le offerte pubblicate, protetti da validazioni formali. Sul fronte client è stata realizzata la dashboard principale del Marketplace (lista proposte) e le interfacce per la pubblicazione e la modifica degli annunci personali. Di rilievo in questo sprint è stato l'enhancement della GUI: l'interfaccia grafica è stata profondamente rivista e rifinita per migliorare l'esperienza

utente complessiva, introducendo layout a card più moderni, una palette di colori coerente, componenti stilizzati e una gestione dei feedback visivi più pulita e intuitiva. Ciascuna funzionalità introdotta è stata validata da test unitari JUnit 5 e rispettosa della Definition of Done.

NOTE, DECISIONI E IMPEDIMENTI

- **Note:** L'attività di enhancement della GUI, nata inizialmente come rifinitura estetica, è stata integrata organicamente nel flusso dello sprint per garantire che il marketplace risultasse subito usabile e visivamente curato.
- **Decisioni del Product Owner:** Il PO ha approvato l'implementazione del marketplace e ha validato positivamente l'enhancement grafico, confermando la conformità dei requisiti delle US-6, US-7 e US-8.
- **User Story non completate:** Nessuna: tutte le user story pianificate per lo sprint sono state portate a termine e chiuse con successo.
- **Impedimenti riscontrati:** Nessun impedimento bloccante di natura tecnica o architetturale.

RETROSPETTIVA

Cosa ha funzionato bene:

- L'avvicendamento nei ruoli (rotazione di Scrum Master e PO) è avvenuto in modo fluido, mantenendo alta la responsabilità e la comunicazione all'interno del team.
- L'attenzione focalizzata sull'enhancement della GUI ha permesso di elevare subito lo standard qualitativo visivo dell'applicazione, rendendo il marketplace molto più intuitivo.

Cosa possiamo migliorare:

- Ottimizzare ulteriormente la pianificazione preventiva dei dettagli grafici prima di iniziare la scrittura del codice di interfaccia, così da ridurre i tempi di iterazione visiva in corso d'opera.

SPRINT 3 — DAL [25/08/2026] AL [27/08/2026]

SPRINT GOAL

Estendere il marketplace di SkillShare con la ricerca avanzata sulle competenze offerte e avviare il primo ciclo reale di interazione tra utenti: permettere di proporre una richiesta di scambio su un annuncio altrui e, per il creatore dell'annuncio, di accettarla o rifiutarla, con aggiornamento dello stato visibile a entrambe le parti coinvolte.

RUOLI DELLO SCRUM TEAM

Membro	Ruolo Scrum in questo sprint
Tommaso Prandini	Scrum Master
Federico Malservigi	Developer
Alessia Sirianni	Product Owner


Gabriele Bufalo	Developer
---------------------------------	-----------

USER STORY IMPEGNATE


ID	User Story	Somma Ore	Esito
US-9	Ricerca Avanzata	7	Completata
US-10	Richiesta di Scambio	4	Completata
US-11	Gestione Prenotazioni	6	Completata

STATO DELLA BOARD SU GITHUB (TRASPARENZA)

BOARD A INIZIO SPRINT — [25/08/2026]

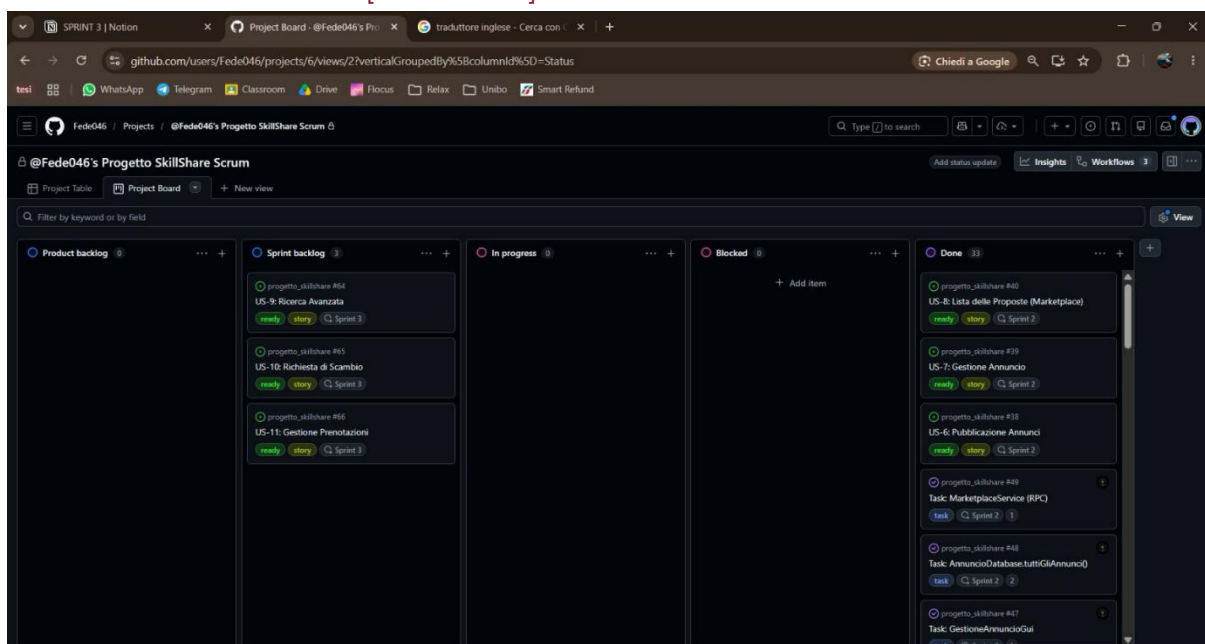

BOARD A FINE SPRINT — [27/08/2026]:

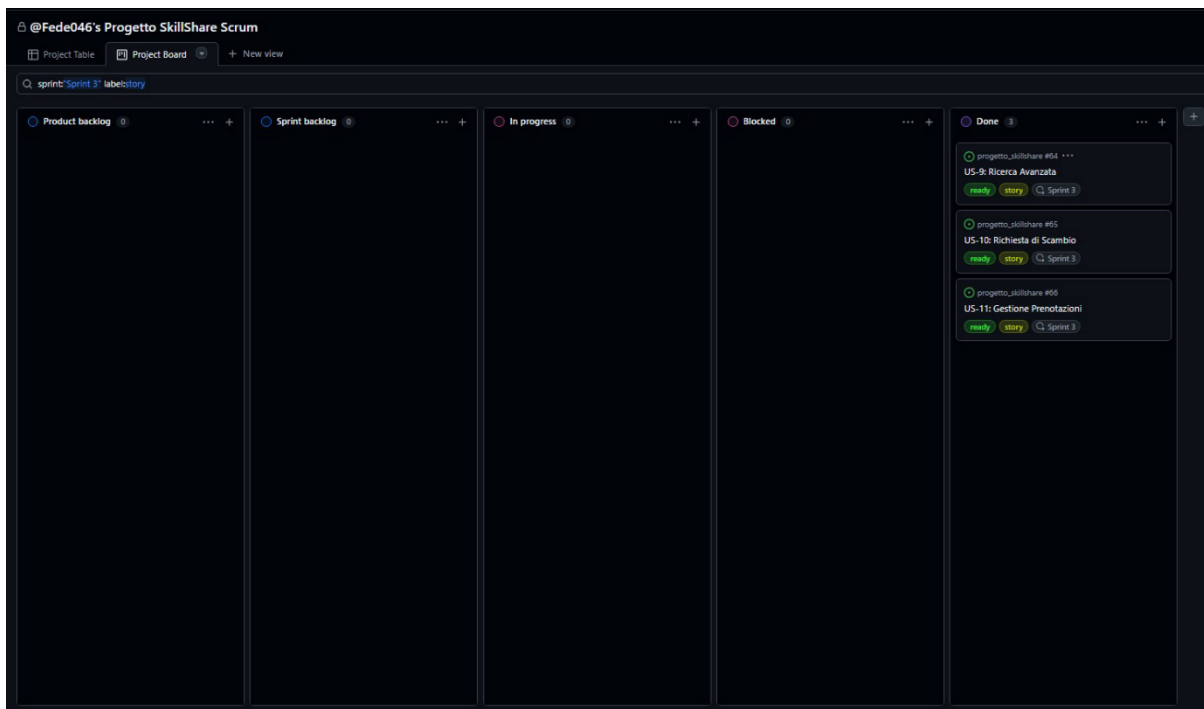

COSA È STATO FATTO DURANTE LO SPRINT

Lo Sprint 3 ha ampliato le capacità del Marketplace introducendo la ricerca per competenza e l'ordinamento alfabetico degli annunci, riusando ed estendendo i servizi RPC già esistenti dallo Sprint precedente, mantenendo la logica autorevole lato server. È stato inoltre introdotto il primo modello di interazione diretta tra utenti: una nuova collezione MapDB dedicata alle richieste di scambio, con relativo DTO e stati (IN_ATTESA, ACCETTATA, RIFIUTATA), gestita da un repository dedicato seguendo lo stesso pattern già consolidato per gli annunci. Sul lato server sono stati esposti i servizi RPC per l'invio di una richiesta di scambio con il vincolo, verificato lato server, che un utente non possa proporsi uno scambio sul proprio stesso annuncio e per la loro accettazione o rifiuto da parte del creatore dell'annuncio, protetta da un controllo di proprietà. Sul fronte client è stata realizzata una nuova schermata "Richieste", raggiungibile dalla barra di navigazione, che mostra le richieste ricevute con azioni immediate di accettazione/rifiuto e le richieste inviate con lo stato aggiornato in tempo reale. La funzionalità di ricerca è stata integrata direttamente nella schermata Marketplace già esistente, mantenendo coerenza visiva con lo stile introdotto nello sprint precedente.

A completamento dello sprint è stato inoltre applicato un fix di miglioria al Marketplace: la ricerca è stata estesa per includere anche il campo titolo dell'annuncio, oltre alla sola competenza offerta, e ogni card annuncio è stata aggiornata per mostrare anche la descrizione (precedentemente salvata ma non visualizzata).

Ciascuna funzionalità è stata validata da test unitari JUnit 5 e rispettosa della Definition of Done.

NOTE, DECISIONI E IMPEDIMENTI

- **Note:** la Chat Interna, terza sotto-funzionalità dell'area "Interazione e Coordinamento", non è stata inclusa in questo sprint e resta nel Product Backlog per una pianificazione futura.
- **Decisioni del Product Owner:** il PO ha confermato che il controllo anti-scambio-su-annuncio-proprio dovesse restare autorevole lato server (non solo nascosto/disabilitato lato client), e ha valutato positivamente l'esito di US-9, US-10 e US-11.
- **User Story non completate:** Nessuna: tutte le user story pianificate per lo sprint sono state portate a termine e chiuse con successo.
- **Impedimenti riscontrati:** nessun impedimento bloccante; è stato necessario un allineamento preventivo tra i due Developer sul modello condiviso RichiestaScambioDTO, essendo alla base sia di US-10 che di US-11.

RETROSPETTIVA

Cosa ha funzionato bene:

- L'accordo preventivo tra i Developer sul modello dati condiviso (RichiestaScambioDatabase/RichiestaScambioService) ha evitato conflitti e permesso di sviluppare US-10 e US-11 in parallelo senza attriti.
- Il riuso del pattern già consolidato negli sprint precedenti (DTO → Database → Service RPC → GUI) ha reso la ricerca avanzata rapida da implementare, integrandosi in modo naturale nella schermata Marketplace esistente.
- L'individuazione tempestiva della miglioria sulla ricerca e sulla descrizione ha permesso di chiuderla nello stesso sprint invece di accumularla come debito tecnico per gli sprint successivi.

Cosa possiamo migliorare:

- Pianificare con maggiore anticipo la navigazione tra le nuove schermate ("Richieste ricevute" e "Richieste inviate"), per ridurre piccoli aggiustamenti fatti in corso d'opera sulla struttura della NavBar.

SPRINT 4 — DAL [28/08/2026] AL [30/08/2026]

SPRINT GOAL

Completare il ciclo di vita dello scambio abilitando la comunicazione diretta tra utenti tramite Chat interna, la chiusura dell'attività e l'introduzione del sistema di reputazione (rilascio recensioni, calcolo media voto nel profilo pubblico e ordinamento per affidabilità nel Marketplace).

RUOLI DELLO SCRUM TEAM

Membro	Ruolo Scrum in questo sprint
Tommaso Prandini	Developer
Federico Malservigi	Product Owner
Alessia Sirianni	Developer
Gabriele Bufalo	Scrum Master


USER STORY IMPEGNATE

ID	User Story	Somma Ore	Esito
US-12	Chat Interna	6	Completata


US-13	Completamento dello Scambio e Recensione	6	Completata
US-14	Trasparenza (Rating Pubblico e Storico)	4	Completata
US-15	Ordinamento degli annunci in base alla valutazione dell'autore	6	Completata

STATO DELLA BOARD SU GITHUB (TRASPARENZA)

BOARD A INIZIO SPRINT — [28/08/2026]:

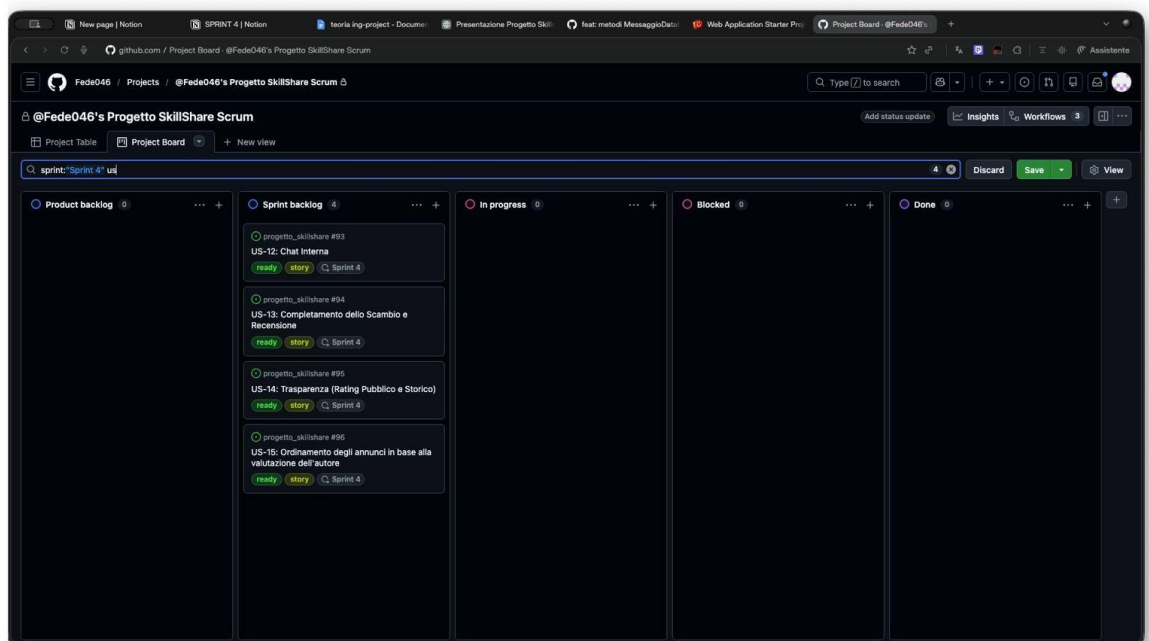

BOARD A FINE SPRINT — [30/08/2026]:

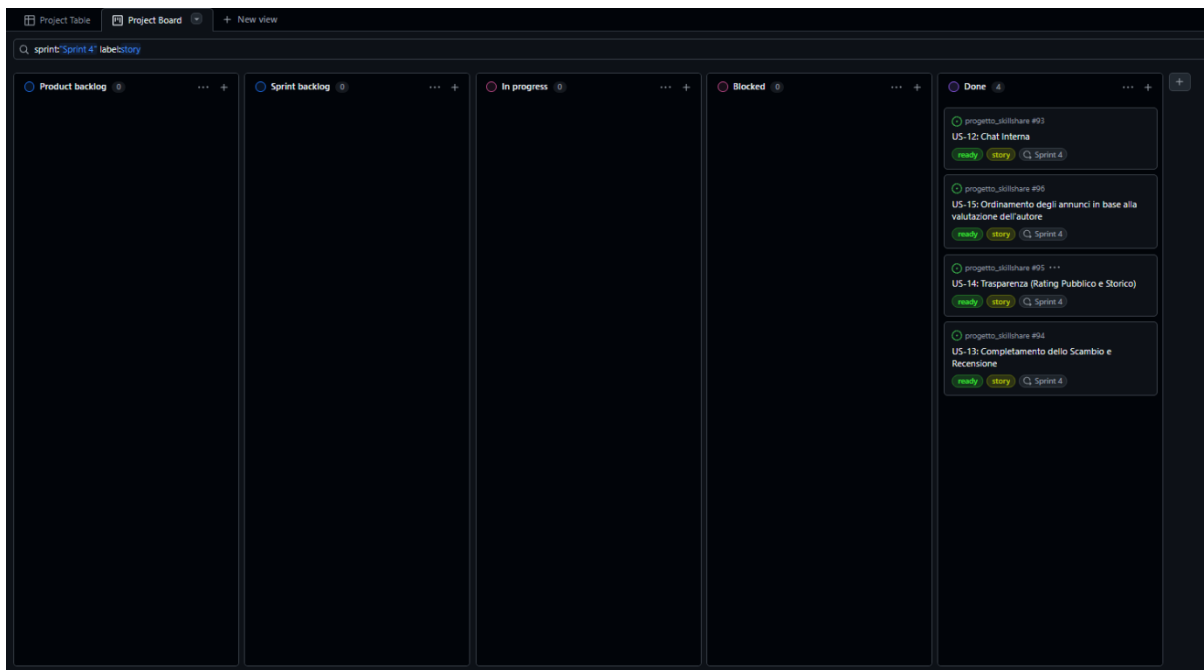

COSA È STATO FATTO DURANTE LO SPRINT

Lo Sprint 4 ha completato il ciclo di vita dello scambio abilitando chat, completamento dell'attività e sistema di reputazione della piattaforma. Sul backend, sono state introdotte nuove collezioni MapDB per messaggi (MessaggioDTO) e recensioni (RecensioneDTO), insieme al nuovo stato COMPLETED per le richieste di scambio. I servizi RPC sono stati estesi per:

- Gestire la cronologia della chat, riservata esclusivamente ai partecipanti di uno scambio con stato ACCEPTED.
- Permettere a entrambi gli utenti di contrassegnare lo scambio come completato e rilasciare una recensione (punteggio 1-5 e commento facoltativo).
- Calcolare la media voto e recuperare i feedback ricevuti da ciascun utente.

Sul client (GWT), è stata sviluppata l'interfaccia di **Chat** contestuale allo scambio e integrata la gestione delle recensioni nella schermata delle richieste completate. Inoltre, il sistema di reputazione è stato esteso sia al **Profilo Pubblico** (con media voto e lista recensioni o messaggio di fallback) sia al **Marketplace**, introducendo l'ordinamento per valutazione decrescente dell'autore con gestione degli utenti senza recensioni in coda.

Tutte le funzionalità sono state validate tramite test unitari JUnit 5 nel rispetto della Definition of Done.

NOTE, DECISIONI E IMPEDIMENTI

- **Note:** con l'implementazione della Chat Interna e della gestione completa del ciclo di vita dello scambio, la sotto-funzionalità di messaggistica è stata chiusa con successo. Eventuali estensioni opzionali (quali notifiche push in tempo reale o filtri avanzati sullo storico recensioni) restano nel Product Backlog per future iterazioni.
- **Decisioni del Product Owner:** Il PO ha confermato l'introduzione dello stato "COMPLETATA" come prerequisito per il rilascio delle recensioni, ha approvato l'aggiunta di idAnnuncio alla recensione per supportare la vista dedicata e l'anticipo di US-15 nello sprint, e ha valutato positivamente l'esito di US-12, US-13, US-14 e US-15.

- **User Story non completate:** Nessuna: tutte le user story pianificate per lo sprint sono state portate a termine e chiuse con successo.
- **Impedimenti riscontrati:** durante lo sviluppo sono emersi due problemi minori, risolti con fix dedicati entro la fine dello sprint: un errore 500 nella creazione di una recensione (Issue #123) e un problema nella visualizzazione dei numeri del rating (Fix: Rating, #131), oltre a un errore di compilazione (#133). Nessun impedimento bloccante di natura tecnica o architetturale.

RETROSPETTIVA

Cosa ha funzionato bene:

L'accordo preventivo sulla struttura dati e l'aggiunta anticipata del campo idAnnuncio in RecensioneDTO hanno evitato refactoring a posteriori, abilitando la vista delle recensioni per annuncio senza attriti. Il riuso del pattern consolidato (DTO → Database → Service RPC → GUI) ha velocizzato lo sviluppo e permesso di completare tutte e 4 le Story pianificate, assorbendo anche le integrazioni del profilo pubblico e delle recensioni per annuncio. La gestione parallela delle attività tra i Developer ha neutralizzato la dipendenza tecnica tra US-14 e US-15, mentre i bug emersi sono stati risolti tempestivamente con fix mirati, garantendo la chiusura dello sprint senza debiti tecnici.

BUFFER — DAL [31/08/2026] AL [DATA CONSEGNA]

OBIETTIVO DEL BUFFER

Consolidare l'incremento prodotto nei quattro sprint in vista della consegna e della difesa finale: risolvere i difetti funzionali emersi durante l'uso end-to-end della piattaforma, completare gli enhancement rimasti in sospeso su profilo e accesso, ripulire il repository, popolare il database con dati dimostrativi e completare la documentazione del codice.

ATTIVITÀ IMPEGNATE

Tipo	Attività	Somma Ore	Esito
Fix	Gestione richieste multiple/concorrenti sullo stesso annuncio	1	Completata
Fix	Reload necessario dopo accettazione per vedere il pulsante di completamento	1	Completata
Enhancement	Gestione foto profilo con upload da locale	1	Completata
Enhancement	Miglioramento pagina login e registrazione	1	Completata

Tipo	Attività	Somma Ore	Esito
Chore	Creazione utenti demo e popolamento database	2	Completata
Chore	Pulizia file inutili nel repository	1	Completata
Documentation	Commenti del codice	1	Completata

COSA È STATO FATTO DURANTE IL BUFFER

Il periodo di buffer non ha introdotto nuove user story ma ha consolidato l'incremento complessivo in vista della consegna, intervenendo su tre fronti: correttezza funzionale, qualità dell'esperienza utente e preparazione del progetto alla valutazione.

Sul piano dei difetti sono stati chiusi due bug emersi dall'uso end-to-end della piattaforma. Il primo riguardava la possibilità per un utente di inviare più richieste di scambio sullo stesso annuncio in presenza di una richiesta non ancora conclusa: il vincolo è stato reso autorevole lato server in `RichiestaScambioDatabase`, che ora blocca con `IllegalArgumentException` la creazione di una nuova richiesta se ne esiste già una in stato `IN_ATTESA` o `ACCETTATA`, consentendola invece dopo un `RIFIUTATA` o `COMPLETATA`; il caso è coperto da test JUnit 5 su tutti e quattro gli scenari. Il secondo riguardava l'aggiornamento della schermata `Richieste`, che richiedeva un reload manuale perché comparisse il pulsante di completamento dopo l'accettazione: la vista è stata resa reattiva alla risposta del servizio, così che accettazione e rifiuto si riflettano immediatamente per entrambi i partecipanti.

Sul piano degli enhancement è stata superata la decisione temporanea presa nello Sprint 1 sulla foto profilo, gestita fino a quel momento come semplice URL testuale: la schermata di modifica profilo permette ora di caricare un'immagine dal proprio dispositivo, con upload al server, validazione di formato (jpg, png) e dimensione massima, messaggio di errore esplicito in caso di file non valido e immagine placeholder come comportamento di default; la logica di validazione lato server è coperta da test JUnit 5 e i test di accettazione preesistenti di US-5 continuano a passare. Sono state inoltre allineate le pagine di login e registrazione, rimaste allo stile dello Sprint 1, alla palette bordeaux/grigio adottata nel resto dell'applicazione, uniformando anche la presentazione dei messaggi di errore; l'intervento è stato volutamente limitato all'aspetto UI/UX, senza modifiche alla logica di autenticazione.

Sul piano della preparazione alla consegna il repository è stato ripulito dalle classi di esempio del template originale e dai file temporanei non necessari, aggiornando `.gitignore` per evitarne il ricommit, verificando che `mvn clean install`, l'avvio via docker `compose up -d --build` e l'intera suite di test continuassero a funzionare. È stato infine predisposto un popolamento riproducibile del database con utenti demo dotati di profilo completo, annunci realistici, richieste di scambio in tutti gli stati previsti, messaggi di chat e recensioni, in modo da rendere immediatamente dimostrabile ogni funzionalità in sede di difesa; le credenziali sono documentate nel Manuale Sviluppatore. In parallelo il codice è stato commentato in modo sistematico, in coerenza con il criterio di valutazione relativo a organizzazione, qualità e leggibilità del codice.

NOTE, DECISIONI E IMPEDIMENTI

- **Note:** il buffer era stato previsto in fase di pianificazione come margine per assorbire attività di consolidamento e imprevisti; non essendosi verificati slittamenti nei quattro sprint, è stato interamente dedicato al miglioramento della qualità dell'incremento e alla preparazione della consegna.
- **Attività non completate:** nessuna: tutte le attività pianificate per il buffer sono state chiuse.
- **Impedimenti riscontrati:** nessun impedimento bloccante.

RETROSPETTIVA FINALE

Cosa ha funzionato bene:

- Aver riservato un buffer in coda alla pianificazione si è rivelato una scelta efficace: ha permesso di chiudere debiti minori e rifiniture senza comprimere gli sprint di sviluppo né rinviare attività alla vigilia della consegna.

Cosa possiamo migliorare:

- Alcune decisioni prese per rispettare le scadenze (come la gestione della foto profilo tramite URL testuale) sono rimaste aperte per tre sprint: sarebbe stato preferibile tracciarle esplicitamente come debito tecnico fin dal momento della decisione, anziché recuperarle solo in fase di consolidamento.
- La cura degli aspetti grafici è stata più volte oggetto di rilavorazione a posteriori (Sprint 1, Sprint 2, buffer): definire fin dall'inizio una guida di stile condivisa avrebbe ridotto le iterazioni visive in corso d'opera.
